

BROJ: 2480

MJESEČNI IZVJEŠTAJ

Jul 2019



Projekat poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju, Faza III

Projekat poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju, Faza III, započela je potpisivanjem ugovora o kreditu sa njemačkom KfW bankom, 07. decembra 2007. godine. U ovoj fazi Projekat je većim dijelom fokusiran na sektor otpadnih voda, kroz poboljšanje i proširenje sistema za odvođenje otpadnih voda u opštinama Herceg Novi, Tivat, Kotor i Bar. U toku ove faze predviđena je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Herceg Novom i Baru sa ispuštima, sanacija i zamjena postojećih sistema za odvođenje otpadnih voda kao i izgradnja novih dijelova. Manji dio Projekta se odnosi na poboljšanje vodosnabdijevanja kroz sanaciju postojećih i izgradnju novih djelova vodovodnih sistema.

Implementacija Faze III, procijenjene vrijednosti u iznosu od 89 miliona eura je započela u martu 2008. godine, pripremom projekta i izradom projektne i tenderske dokumentacij od strane konsultantske kompanije JV DAHLEM/Pecher iz SR Njemačke.

Tivat	
Opis projekta za ugovor broj TV-RB-02 -2010	Izgradnja: <ul style="list-style-type: none">– 17,6 km kanalizacione mreže– 14,6 km vodovodne mreže– 6 većih i 6 manjih pumpnih stanica
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine u Tivatskom zalivu
Vrijednost ugovora	9,491 mil. €
Datum početka i datum završetka realizacije ugovora	14. decembar 2011. – 31. decembar 2014. godine
Investitor	Opština Tivat i Vodovod i kanalizacija Tivat
Izvori finansiranja	Sredstva Opštinskog budžeta u iznosu od 3,955 mil.€, kreditna sredstva Njemačke razvojne (KfW) banke u iznosu od 5,379 mil. € i donacija KfW banke 155.750 €
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Izvođač	Kompanija Ludwig Pfeiffer (Njemačka)
Stručni nadzor	Kompanija Dahlem (Njemačka)

PROGRES

Donesena je presuda od strane KRS-a (tokom mjeseca maja), prema kojoj je obaveza Investitora (Opštine Tivat) da isplati Izvođaču iznos od 539,147.02 eura bez PDV-a od 832,655.68 eura, koliko je Investitor zadržao na ime odštete za kašnjenje. Rok koji je KRS postavio Investitoru za izvršenje svoje obaveze iznosi 21 dan od datuma donošenja odluke KRS-a, tj. do 12.06.2019. godine. Nakon dobijene presude upućeno je pismo Rukovodiocu Izgradnje, da procesuirá okončanu situaciju, kako bi Investitor mogao da izvrši svoje obaveze, u skladu sa ugovorom.

Herceg Novi

Opis projekta za ugovor Broj HN -YB-2010	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 65.300 ekvivalent stanovnika
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema za odvođenja otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine u Bokokotorskom zalivu.
Vrijednost ugovora	9,020 mil. €
Datum početka i datum završetka	24. jun 2012. do 12.06.2017.
Investitor	Opština Herceg Novi i Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštini Herceg Novi
Izvori finansiranja	Kredit KfW banke 6,304 mil.€, učešće Vlade CG 1,351 mil.€ i budžet Opštine 1,366mil.€
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Izvođač	JV MASS/ Gintas (ugovor raskinut 21.11.2018.)
Stručni nadzor	Kompanija Dahlem (Njemačka)

HN -YB-2010

PROGRES

U ovom periodu nije bilo progresa. Zvanično je raskinut ugovor sa Mass-Gintasem 21.11.2018. godine. Naplaćen je iznos od 1.767.561,97 eura, po osnovu činidbene i retencione garancije. Intencija Investitora je da iz navedenih sredstava kompletira preostale radove od strane drugih izvođača. Za sada su zaključena dva ugovora sa CMC grupom i Biogest International, direktnom dodjelom, po uslovima Fidic zelene knjige. U pripremi je tender za preostale radove po uslovima roze Fidic knjige, sa elementima žute knjige, kao i još jedan tender po zelenoj knjizi Fidica za SCADA sistem. Detaljnije u nastavku izvještaja.
Investitor i dalje samostalno upravlja postrojenjem.

ODŠTETNI ZAHTJEVI

Rukovodilac izgradnje je dopisom od 28.01.2019. odbacio odštetni zahtjev koji je podnio Izvođač, navodeći kao razlog da za isti nisu dostavljene "Najave odštetnih zahtjeva" u roku od 28 dana kao što je propisano Članom 20.1 Ugovora. Navedeni dopis uručen je Izvođaču 08.02.2019. godine. Mass-Gintas je potvrdio prijem dopisa Rukovodilca izgradnje, izrazio svoj stav da je isti "neprihvatljiv" i zahtjevao je od Investitora imenovanje člana KRS-a u skladu sa članom 20.2 ugovora. U svom izvještaju Rukovodilac izgradnje je napomenuo da u odsustvu dogovora dvije strane, predsjednik FIDIC-a treba da imenuje KRS.

GARANCIJE

- Avansna garancija – avans je vraćen, nema potrebe za garancijom.
- Činidbena garancija – važila do 10.12.2018. godine – **garancija je aktivirana i naplaćena.**
- Retenciona garancija – važila do 10.12.2018. godine – **garancija je aktivirana i naplaćena.**

PLAĆANJA

Za vrijeme ovog izvještajnog perioda nije bilo izvršenih plaćanja.

Ukupna plaćena suma (uključujući avans sa PDV-om): 9,955,055.22€
KfW kredit (faza III) 2,863,000.00 €
KfW kredit (faza IV) 3,441,000.00 €
Opštinsko učešće 711,664.36€
Opštinsko učešće (PDV) 1,589,462.59€
Donacija Vlade: 1,349,928.28 €

OSTALO

Konsultant je nastavio sa pripremom tendera po Rozoj knjizi i Zelenoj knjizi br. 4. Dana 08. jula 2019. Vodacom je od Dahlema dobio odgovor na komentare Investitora, u vezi radne verzije tendera po Rozoj knjizi.

GB1-HN-2019

Herceg Novi Ugovor br.1 po Zelenoj Knjizi Fidica sa CMC Group DOO Herceg Novi

OSNOVNI PODACI

Početna prihvaćena cijena Ugovora bez PDV-a: 128.620,00€
Početna prihvaćena cijena Ugovora sa PDV-om: 155.630,20€
Datum potpisivanja Ugovora 09.04.2019.
Datum početka radova: 16.04.2019.
Datum završetka Ug. roka:
• Za pozicije C1.21A, C1.22, C1.23, C1.24, C1.25A, C1.25B i C1.26 09. jul 2019.
• Za poziciju C1.21B 08. avgust 2019.

AKTIVNOSTI

- Budžet je povećan za 25.391,00€ da pokrije dodatne popravke.
- Od Izvođača traženi opcioni senzori za temperaturu vazduha i ulja na kompresorima su instrukcijom.
- Od Izvođača je traženo da dostavi ponudu za dodatne kablovske veze za dizel generator.
- Progres je u zaostatku u odnosu na važeći Dinamički plan.
- Dostavljen je projekat cjevovoda.
- Naručeni su rezervni djelovi za senzore kiseonika.
- RAM X 600 kompresori su na servisu i popravci.
- Pumpe su stigle na Gradilište.
- Frekventni regulator je popravljen.
- Dizalica u kompresorskoj stanici je uzemljena.

PROGRES

Prema nalazu defektaže na prvom RAM X 600 kompresoru naručeno je nekoliko dodatnih ležajeva i brtvi. Defektaža i servis na ostalim kompresorima su nastavljeni. Ispitivanje dizel generatora je pripremljeno i planirano za kasnije. Frekventni regulator je popravljen, ispitan i ponovo ugrađen. Dana 26. jula 2019. pumpe su stigle na gradilište, a dana 12. jula 2019. dostavljen je Projekat cjevovoda.

ODŠTETNI ZAHTJEVI

Nema.

PLAĆANJA

Dana 04. jula 2019. Izvođač je potvrdio prijem avansa na dan 27. jun 2019.

VARIJACIJE

Nema.

OSTALO

Tokom korišćenja postojeće dizalice u prostoriji sa kompresorima jedna osoba je doživjela strujni udar, srećom bez tjelesnih povreda. Dizalica nije bila adekvatno uzemljena. Dahlem i CMC su uzemljili dizalicu i potvrdili da je ista bezbjedna za korišćenje.

GB3-HN-2019

Herceg Novi Ugovor sa Biogest International GmbH

OSNOVNI PODACI

Početna prihvaćena cijena Ugovora bez PDV-a: 86.484,00€

Početna prihvaćena cijena Ugovora sa PDV-om: 104.645,64€

Datum potpisivanja Ugovora: 14.05.2019.

Datum početka radova: 1 dan nakon prijema Avansa

Datum završetka Ug. roka: biće potvrđeno (Rok za završetak je 85 dana)

AKTIVNOSTI

Sav materijal je stigao na gradilište dana 31. jula 2019. Istog dana Konsultant je održao sastanak sa Izvođačem i operaterom PPOV gdje je usvojen redosljed ugradnje na tri SBR bazena.

PROGRES

Materijal je isporučen na gradilište.

ODŠTETNI ZAHTJEVI

Nema.

PLAĆANJE

Nema.

VARIJACIJE

Nema.

Herceg Novi

Opis projekta za ugovor broj HN-RB-01-2010	Izgradnja: <ul style="list-style-type: none">- 35,3 km vodovodne i kanalizacione mreže- 11 pumpnih stanica i 1 podmorski ispust
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenja otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine u Bokokotorskom zalivu.
Vrijednost ugovora	18,522 mil.€
Datum početka i datum završetka realizacije	25. avgust 2012. do 17. februara 2015.

ugovora	
Investitor	Opština Herceg Novi i Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštini Herceg Novi
Izvori finansiranja	Kredit KfW banke 14,516mil.€, učešće Vlade CG 2,923 mil.€ i budžet opštine 0.926 mil€ i donacija KfW banke 0.155 mil €
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Izvođač	Celtikcioglu (Turska)
Stručni nadzor	Kompanija Dahlem (Njemačka)

AKTIVNOSTI

Neke od stavki sa Liste nedostataka koje je Izvođač otklonio, Dahlem je prihvatio da isprati bez nadoknade za Vodacom i sljedeće je Vodacomu dostavljeno, kao informacija i na dalje postupanje:

- Pregled/ispitivanje šahtova HN 3290, 3300, 3320, 3330, 3340 i 33504.
- Pregled/ispitivanje šahtova HN 3360, 3370, 3390, 3400 i 34055.
- Ažuriranje tabela 1 i 2 iz Liste nedostataka.
- Pregled CCTV izvještaja.

PROGRES

Izvođač je radio na Obračunu na završetku radova i nekim stavkama sa Liste nedostataka.

GARANCIJE

- Polisa osiguranja radova – ističe 01.07.2019. godine.
- Avansna garancija – istekla 01.06.2017. godine – avans je isplaćen.
- Činidbena garancija – ističe 31.12.2019. godine.
- Retenciona garancija – ističe 31.07.2019. godine.

VARIJACIJE

-

PLAĆANJA

Nakon potpisivanja Aneksa br. 7, Izvođač je dostavio revidovani Zahtjev za plaćanje br. 23 dana 08.04.2019. Plaćanje je ovjereno kroz izdavanje Prve revizije Privremene situacije br. 23 od strane Rukovodioca izgradnje dana 09.04.2019. bez primjene PDV-a u skladu sa odlukom Poreske uprave Crne Gore (br. 03/7-8274/2-19 od 05.04.2019.). Izvor sredstava je kredit KfW banke (Faza V2). Izvođač je dana 17.04.2019. potvrdio prijem sredstava poravnjanja u iznosu od 2.300.000,00 € koji je naveden u Aneksu br. 7.

Dosadašnja izvršena plaćanja :

Ukupna plaćena suma (uključujući avans i PDV): 23.206.695,40€

Vlada: 2.923.000,00 €

Donacija KfW: 155,750.00 €

KfW kredit (Faza III) 5.876.981,23 €

KfW kredit (Faza IV) 6.083.105,39 €

KfW kredit (Faza V2) 4.295.128,95€

Opštinsko učešće 399.590,34 €

Opštinsko učešće (PDV) 3.473.139,51€

OSTALO

S obzirom da Dahlem nije prihvatio da se automatski aktivira opciona stavka iz Aneksa 40 za usluge tokom RPN, prihvatio je da do kraja avgusta 2019. isprati određene stavke za koje su se Strane složile da budu kompletirane prema Listi nedostataka u prilogu Potvrde o preuzimanju radova, ukoliko se Izvođač bude držao zadatih rokova.

Stavke sa Liste nedostataka koje će Dahlem ispratiti su sledeće:

Stavka 1: Pregled svih projekata održavanja i izvedenog stanja. Rok za Izvođača 15. jul 2019.

Stavka 10: Prisustvo tokom ispitivanja na infiltraciju navedenih u tabeli 1. Rok za Izvođača 15. jul 2019.

Stavka 17: Prisustvo tokom ispitivanja šahtova iz tabele 2, prva kolona desno. Rok za Izvođača 01. jul 2019.

Stavka 18: Pregled CCTV snimaka za sekcije iz tabele 3. Rok za Izvođača da dostavi snimke 22. jul 2019.

Nakon sastanka u Opštini Herceg Novi, koji se održao 18. jula 2019. u prisustvu Vodacoma, Predsjednika, Potpredsjednice, i direktorke ViK-a, Dahlem je izjavio da će preispitati svoj stav u vezi pružanja usluga tokom RPN u Herceg Novom.

Bar	
Opis projekta za ugovor broj BR-RB-2009	<p>Izgradnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5,8 km vodovodne mreže - i 19,2 km fekalne kanalizacione mreže - 1 km atmosferske kanalizacione mreže - 1 pumpne stanice sa izgradnjom novog podmorskog ispusta "Sutomore" - 1 rezervoara "Šušanj 2" <p>Dodatne mjere: "Novi koncept projekta u Baru"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje za naselja Polje, Zaljevo, Sveti Ivan i Mala Volujica, kao i izgradnja kanalizacione Pumpne stanice Volujica sa potisnim cjevovodom
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenja otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine.
Ugovorena vrijednost projekta	11,191.128 mil.€
Datum početka i datum završetka realizacije ugovora	26. februar 2016. / 26. februar 2018.
Investitor	Opština Bar i i Vodovod i kanalizacija Bar
Izvori finansiranja	Kredit KfW banke faze III 10,177.801 mil.€, budžet opštine 0.857 mil.€, 0.155 mil.€ donacije KfW-a
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Izvođač	MPP Jedinstvo (Srbija)
Stručni nadzor	Kompanija Dahlem (Njemačka)

AKTIVNOSTI

Radovi po Osnovnom ugovoru: Rok za prijavu nedostataka za osnovni Ugovor je u toku i organizovan je obilazak radova na kraju RPN-a. Za provjeru podmorskog ispusta Rukovodilac izgradnje je tražio od Izvođača da mobiliše ronioca radi video snimanja. Nisu se javili dodatni nedostaci u toku izvještajnog perioda. Polomljene šarke na nekoliko šaht poklopaca ne mogu da se poprave. Izvođač je nabavio samo nekoliko, pošto je proizvođač prekinuo proizvodnju. Investitor je obavijestio na kojim mjestima treba ugraditi zamjenske poklopce. Ostali oštećeni poklopci neće biti zamijenjeni. Umjesto toga, Investitor je pristao da od Izvođača primi slične poklopce i da ih stavi na zalihu.

Sekcija 1: Cjevovod za Sv. Ivan - Poslednjih 30 m je položeno i ispitano. Projekat održavanja i izvednog stanja nije dostavljen, te stoga dokumentacija Izvođača nije kompletna i to je dovelo do kašnjenja.

Sekcija 2.1: PS Volujica - Izmjena projekta u cilju smanjenja kašnjenja, u smislu isključenja projekta napajanja iz ostatka projektne dokumentacije obavljena je u julu 2019. i Investitor je prosljedio projekat na reviziju u Podgoricu. Odgovor se očekuje krajem avgusta 2019. godine, a početak radova sredinom septembra. Fabrička ispitivanja KSB pumpi u prisustvu stručnih lica su izvedena uspješno. U slučaju da radova počnu oko 15. septembra 2019. godine i da teku uobičajenom dinamikom, testiranje i puštanje u rad će se desiti krajem maja 2020. godine. Rukovodilac izgradnje je na inicijativu Vodacoma tražio od Izvođača da dostavi ponudu za ubrzanje radova. Ista još uvijek nije dostavljena.

Usljed kašnjenja Izvođača sa pripremom projekta i Investitorovog kašnjenja sa dobijanjem potrebnih dozvola, završetak radova prema Aneksu 6 neće biti moguć u roku. Sredstva ne mogu biti isplaćena prema planu do kraja 2019. godine. Izvođač je dostavio ažuriranu prognozu protoka novca gdje se navodi isplata od oko 510.000 € do kraja 2019. godine.

Sekcija 2.2: Vodovod u Zaljevu - Progres na Sekciji 2.2 je ušao u kašnjenje, jer završna ispitivanja u prvom pokušaju nisu uspjela. Priručnik za eksploataciju i održavanje i projekat održavanja i izvedenog stanja takođe nisu dostavljeni.

PROGRES

Osnovni Ugovor - Pregled radova na kraju Roka za prijavu nedostataka je u toku. Upotrebne dozvole nisu izdate za B18, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B29, B30 i B34. Popravke nedostataka prema Članu 11.1 su u toku.

Sekcija 1 – Završeno i ispitano.

Sekcija 2.1 – Projekat je na reviziji u Podgorici. Elektro uslovi još nisu riješeni. Fabrička ispitivanja pumpi uspješno obavljena. Ponuda za ubrzanje radova je u pripremi.

Sekcija 2.2 – Vodovod Zaljevo:

Rezervoar

Završen i spreman za ispitivanje.

MRB

Završen i spreman za ispitivanje.

Šaht priključka na RV

Završen i spreman za ispitivanje.

Cjevovod od priključnog šahta RV do rezervoara

Završen i spreman za ispitivanje.

Cjevovod od rezervoara prema Polju

Završen i spreman za ispitivanje.

PROBLEMI

Elektro uslovi još nisu riješeni.

VARIJACIJE

Varijacija br. 17 – Napojni kablovi za rezervoar Zaljevo – čekaju se potpisi.

Varijacija br. 18.1 – Fazonerija i cijevi za Zaljevo – čekaju se potpisi.

Varijacija br. 18.2 – Promjena krovnog materijala za Zaljevo – čekaju se potpisi.

Varijacija br. 18.3 – Projekat priključenja Stari Bar - Polje – čekaju se potpisi.

Investitor je tražio od Izvođača da dostavi ponude za (a) projekat prečišćavanja vazduha na PS Volujica, (b) projekat produžetka vodovoda iz rezervoara Zaljevo duž magistrale, i (c) ažuriranje projektne dokumentacije za B12 Distributivni vodovod u Šušnju.

ODŠTETNI ZAHTJEVI

Investitorov Odštetni zahtjev za kašnjenje:

Investitor je dao ovlaštenje Rukovodiocu izgradnje da izda najavu u skladu sa Članom 2.5 [Potraživanja Investitora] shodno Članu 8.7 [Ugovorna kazna za kašnjenje]. Najava je dostavljena 20.07.2018. Rukovodilac izgradnje konsultovao se sa Investitorom u vezi potencijalnih odštetnih zahtjeva zbog kašnjenja za Sekciju 1 i 2.2.

Izvođačev odštetni zahtjev:

Najava odštetnog zahtjeva br. 7 za izmjene u zakonodavstvu za uvoz varijacija br.12.4 je dostavljena 24.08.2018. Nakon toga, za ovaj događaj nije dostavljen odštetni zahtjev.

Izvođač je dostavio odštetni zahtjev br. 4 za kašnjenje u dozvoli pristupa za dionicu 2.1 dana 05.02.2019. Dana 22.02.2019 Izvođač je povukao svoj odštetni zahtjev najavljujući dostavu novog dokumenta. Novi podnesak je dostavljen 02.03.2019. Rukovodilac izgradnje je odgovorio o principu odštenog zahtjeva i tražio od Izvođača dodatne informacije. Nije evidentiran nikakav podnesak.

GARANCIJE:

- Osiguranje radova – ističe 16.12.2019. godine.
- Avansna garancija – ističe 22.01.2020. godine.
- Činidbena garancija – ističe 24.01.2022. godine.

PLAĆANJA

Dana 23.03.2019. Izvođač je dostavio Privremenu Situaciju br. 15 koju je dana 28.03.2019. Rukovodilac izgradnje ovjerio za plaćanje.

Opština je u obavezi da plati 2.828,92 € plus PDV u iznosu 660,08 €, a KfW 129.031,65 € do 18.05.2019. Dana 13.06.2019. KfW banka je platila 129.031,65€ i dana 25.06.2019. iznos 2.828,92€ plus PDV 660,08€.

Do sada izvršena plaćanja:

Ukupna plaćena suma (uključujući avans): 8.565.559,72€

KfW kredit (Faza III) 7. 676.418,10€

KfW sredstva donacije 155.750,00€

Opštinsko učešće 599.936,28€

Opštinsko učešće (PDV) 133.455,35€

Bar	
Opis projekta	Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda kapaciteta 30.000 ekvivalent stanovnika u Sutomoru, izgradnja kanalizacione mreže u Sutomoru i vodovodne mreže u Šušnju, rehabilitacija postojećeg podmorskog ispusta Volujica i izgradnja vodovodne mreže u naseljima na jugu Bara
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema odvođenja otpadnih voda i vodosnabdijevanja i poboljšanje uslova životne sredine
Procijenjena vrijednost projekta	Okvirno 12,4 mil.€
Investitor	Opština Bar i i Vodovod i kanalizacija Bar
Izvori finansiranja	Kredit KfW banke 10,0 mil.€ (od čega MF prosljeđuje kao grant 1 mil. €), grant MF-a u okviru Faze V2 u iznosu od 2 miliona, sopstveno učešće Opštine 0,453 (preliminarni podaci)
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Konsultant za implementaciju Faze III	Kompanija Dahlem (Njemačka)
<p>Kako je Opština Bar ranije odlučila da odloži sve aktivnosti vezane izgradnju PPOV-a na Volujici (68.600 ES, okvirno 12,4 miliona eura), zbog problema u vezi vlasništva nad zemljištem i nekih konceptualnih dilema, otpočela je sa realizacijom nova faza projekta koja obuhvata izradu "Studije lokacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Opštinu Bar". KfW banka je obezbijedila donaciju Njemačke Vlade za izradu navedenog dokumenta i očekujemo da će ova Studija pomoći Opštini da donese konačnu odluku o nastavku investicionih aktivnosti vezano za PPOV.</p> <p>Nakon završetka tenderskog dokumenta, sproveden je, zbog nedostatka vremena, skraćeni tenderski postupak, tako što je upućen direktni poziv aktivnim konsultantima (Dahlem, Fichtner, GWK) da dostave svoje ponude. U predviđenom roku pristigle su samo dvije ponude (Dahlem i Fichtner). Nakon što je završena evaluacija pristiglih ponuda, izabran je najbolje ocijenjeni ponuđač, kompanija Fichtner, sa kojom je potpisan ugovor.</p> <p>Prezentacija nacrtu završnog izvještaja Studije za izbor lokacije PPOV Bar održana je u Opštini Bar 09.05.2019. godine. Decentralizovan sistem se pokazao kao najisplativija opcija, naime predviđa se izgradnja pet PPOV-ova:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bar PPOV (52.000 ES), 2. Sutomore PPOV (21.000 ES), 3. Veliki Pijesak PPOV (7.000 ES), 4. Čanj PPOV (3.500 ES), 5. Bušat PPOV (3.000 ES). <p>Nakon prezentacije organizovan je kratki sastanak gradonačelnika Bara i predstavnika KfW banke i označeni su mogući investicioni prioriteti čija je realizacija predviđena u okviru Faze V:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPOV u Sutomoru (za koje je moguća lokacija data u Studiji). 2. Vodovodna i kanalizaciona mreža u naselju Dobra Voda. 	
AKTIVNOSTI	

U vezi gore navedenog, Vodacom je 14.06.2019. uputio molbu za održavanje sastanka, koji je trebalo da definiše naredne korake i prioritete u vezi daljih investicionih mjera za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Opštini Bar.

Dana 25.07.2019. u Opštini Bar je održan sastanak na kome su istaknuti određeni problemi sa prostorno planskom dokumentacijom, postojećim kreditnim opterećenjima Opštine Bar, a izjašnjenje o daljim koracima u vezi faze V je odloženo do sastanka koji će se organizovati u MORiT-u.

Kotor	
Opis projekta	Izgradnja: <ul style="list-style-type: none"> - 34,2 km vodovodne i kanalizacione mreže - 5 pumpnih stanica
Očekivani rezultat radova	Poboljšanje sistema za vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda i uslova životne sredine u Kotorskom zalivu
Vrijednost ugovora	6,771 mil.€ bez PDV-a
Datum početka i datum završetka realizacije ugovora	20. jul 2011. do 15. jun 2013. godine
Investitor	Opština Kotor i Vodovod i kanalizacija Kotor
Izvori finansiranja	Sredstva Opštinskog budžeta u iznosu od 0,544 mil. €, učešće Vlade u iznosu od 1,341 mil. €, kreditna sredstva Njemačke razvojne (KfW) banke u iznosu od 4,731 mil.€ i donacija KfW banke 155,750 €
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Izvođač	MPP Jedinstvo (Srbija)
Stručni nadzor	Kompanija Dahlem (Njemačka)
	RADOVI PREDVIĐENI UGOVOROM SU ZAVRŠENI I ISTEKAO GARANTNI ROK

FAZA IV

Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali - Faza IV obuhvata izgradnju zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat kapaciteta 72 000 PE.

Kotor i Tivat

Opis projekta za ugovor YB-T-K 2011	Izgradnja zajedničkog postrojenja za tretman otpadnih voda za Kotor i Tivat kapaciteta 72.000 ekvivalent stanovnika
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenja otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine.
Vrijednost ugovora	10,266 mil.€
Datum početka i datum završetka realizacije ugovora	23. januar 2015. do 20. jun 2016.
Investitor	Vodovod i kanalizacija Kotor i Tivat
Izvori finansiranja	Kreditna sredstva KfWa 10,193 mil€ i budžet opštine 73,751 €
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Konsultant	GKW Consult GmbH (Njemačka)
Izvođač	WTE (Njemačka)

PROGRES

Početak mjeseca jula, tačnije 09.07.2019. godine, održan je pregovarački sastanak sa Izvođačem (WTE) na teme, produženja pružanja usluga nakon 31.08.2019. godine, kao i obuci osoblja, čije se zapošljavanje očekuje najkasnije u septembru. Na sastanku je dogovoreno da Izvođač dostavi finansijsku ponudu Investitorima, koja će obuhvatati nastavak upravljanja i održavanja postrojenja nakon 31.08.2019. godine, u trajanju od 6 mjeseci obavezno, plus 6 mjeseci opciono. Nakon dobijanja finansijske ponude, organizovaće se sljedeći pregovarački sastanak, na kojem će se definisati prava i obaveze obje strane. Kako su budžetom predviđena sredstva za odvoženje mulja iscrpljena u prethodnom periodu, pojavio se problem finansiranja odvoženja mulja sa postrojenja, kao i angažovanje eksterne laboratorije tokom četvrte kampanje testiranja. Na pomenutom sastanku, Izvođač je prihvatio da preuzme obavezu odvoženja mulja, nezavisno od procenta suve materije, dok će fakturu za odvoženje mulja ispostaviti Investitorima kroz privremenu situaciju. Rezultati treće kampanje „testiranja po završetku“ su dostavljeni 16.07.2019. godine i testiranje je ocijenjeno kao uspješno. Četvrta kampanja „testiranja po završetku“ je otpočela 01.07.2019. godine i trajaće 42 dana, do 11.08.2019. godine.




PPOV za opštine Kotor i Tivat

FAZA V (Komponenta 1)

Projekat poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju Faza V (komponenta 1) ima za cilj poboljšanje mreža za vodosnabdijevanje i za odvođenje otpadnih voda u opštini Ulcinj, implementaciju urgentnih investicionih mjera u opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi, kao i izgradnju postrojenja za solarno isušivanje kanalizacionog mulja iz postrojenja za tretman otpadnih voda za opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi.

Ulcinj- Investicioni projekat	
Opis projekta	Prva faza unaprijeđenja vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Ulcinju: <ul style="list-style-type: none"> – Rad Konsultanta za implementaciju projekta – Nabavka reparacionog materijala
Očekivani rezultat projekta	Sistematsko unapređenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine
Vrijednost	Okvirno 20 mil.€
Početak	2012
Izvori finansiranja	Kredit KfW banke iz Faze V, budžet opštine Ulcinj
Uloga Vodacoma	Menadžment Projekta i partner Konsultantu
PROGRES	
<p style="text-align: center;">1. Faza priprema Projekta za implementaciju u Ulcinju</p> <p>Nakon završetka tenderskog postupka, 03. avgusta 2016. u Ulcinju je potpisan ugovor sa konsultantskom kompanijom Hydrophil GmbH iz Beča. Za datum početka ugovora određen je 01. septembar 2016.</p> <p>Planirano je da se projekat odvija u 3 faze. Prva i druga faza u trajanju od približno 18 mjeseci podrazumjevaju izradu Glavnih projekata rekonstrukcije i proširenja vodovodne i kanalizacione infrastrukture i sprovođenje tenderske procedure za angažovanje Izvođača radova. Treća faza se odnosi na nadzor nad izvođačkim radovima u trajanju od 2 godine.</p> <p>Glavnim projektima će u sistemu za vodosnabdijevanje biti obuhvaćena rehabilitacija karstnih izvora i pumpnih stanica, rezervoara i prekidnih komora, izgradnja rezervoara Đerane i rezervoara Brajša, instalacija mjernih mjesta i SCADA sistema, izgradnja novih cjevovoda sa akcentom na glavnu i distributivnu mrežu Donjeg Štoja. Manja sredstva će biti opredijeljena za sistem otpadnih voda kojima se planira rehabilitacija podmorskog ispusta Đerane i sanacija fekalne i atmosferske kanalizacije u užem gradskom jezgru.</p> <p>U Opštini Ulcinj je u okviru kfW misije održan sastanak 08.maja 2019. na kojem su učesnici diskutovali o statusu Elaborata parcelacije, nacrtu tenderskog dokumenta. Za ovaj sastanak Vodacom je pripremio nacrt Plana za dalje aktivnosti svih učesnika u Projektu na koji su svi učesnici dali komentar. Nakon dogovorenih korekcija Plan je proslijeđen svim učesnicima sa ciljem da se pridržavaju dogovorenih obaveza i dinamike navedene u Planu.</p>	

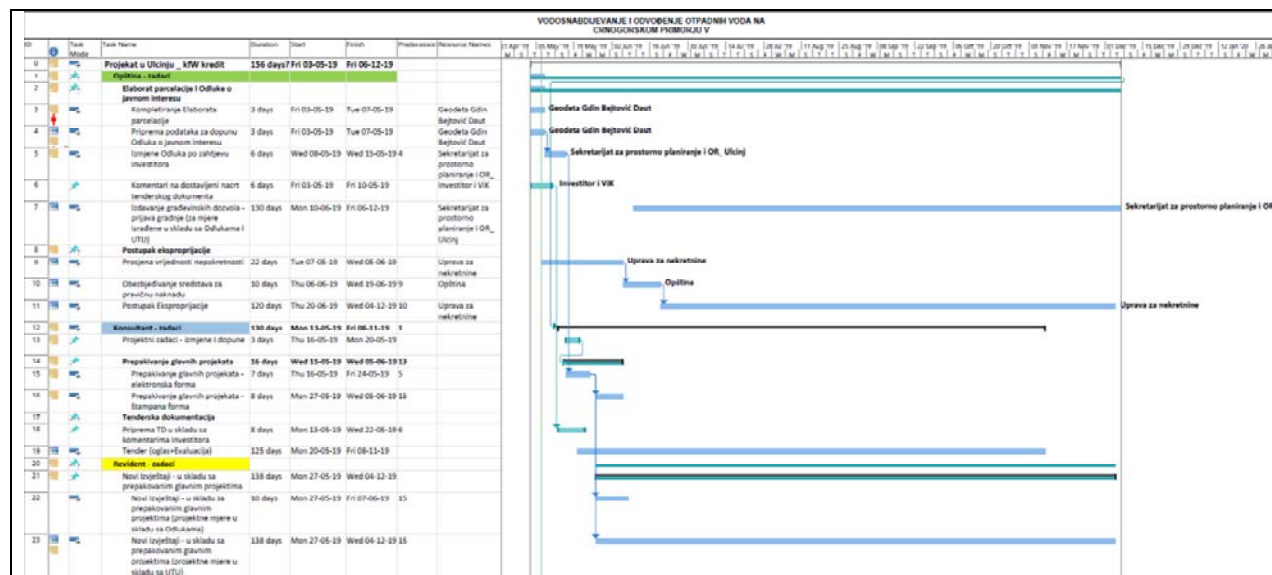

Prema Planu tender za izbor Izvođača bi trebalo da bude raspisan 20.maja dok je procijenjeno da bi postupak Eksproprijacije mogao da se završi 04. decembra 2019. godine.

Nacrt pozitivnog Revidentskog Izveštaja za preostali dio projektnih mjera koje su urađene u skladu sa UT uslovima dostavljen je 20. juna 2019. godine.

Nakon detaljnih usklađivanja Elaborata parcelacije sa Projektantom 21. juna 2019. godine Investitoru je dostavljen konačni Elaborat (za potpunu i nepotpunu eksproprijaciju).

Konsultant je u saradnji sa Vodacomom 17. jula 2019. pripremio i predao Zahtjeve za izmjene Projektnih zadataka za 5 mjera adaptacije i Zahtjeve za izmjene Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa i Projektnih zadataka za 9 projektnih mjera rekonstrukcije i izgradnje novih objekata. Do kraja izvještajnog perioda izvršen je potreban pregled i ovjera navedene dokumentacije.

Investitoru je ViK-u Učlcinj je 19. jula 2019. dostavljena konačna verzija tenderskog dokumenta.

Sekretarijat za zaštitu imovine opštine Učlcinj je u saradnji sa Obradaivačem Elaborata i Vodacomom pripremio i predao 23. jula 2019. kompletiran Zahtjev za procjenu nepokretnosti (koja je obuhvaćena Elaboratima parcelacije) Upravi za nekretnine.

KfW banka je 25. jula 2019. dostavila „no objection“ na tendersku dokumentaciju.

Vodacom u saradnji sa Konsultantom vrši pripremu teksta Oglasa koji će biti objavljen u GTAI (Germany Trade And Invest) i dnevnim novinama u Crnoj Gori.

PROBLEMI

Broj zaposlenih u ViK-u je i dalje veći od 120 (126 zaposlena). Iako je Odbor direktora ViK-a Učlcinj usvojio sistematizaciju radnih mjesta na 100 (čime su stečeni uslovi za smanjenje broja radnika), izvjesno je da bez značajnije pomoći Opštine neće biti ispunjen uslov za smanjenje broja zaposlenih na 120, što je preduslov za raspisivanje tendera odnosno, dalju realizaciju investicionog projekta.

Iz perspektive Programa, nivo zaposlenih u ViK-u Učlcinj ostaje jedina projektna odrednica, koja nije dostignuta u pogledu sticanja potrebnih uslova za nastavak investicionog programa u Učlcinj, odnosno 120 zaposlenih do avgusta 2017. godine (potrebno je za izbor izvođača radova) i 100 zaposlenih (prije potpisivanja ugovora).

Pored navedenog, ViK Učlcinj je suočen sa dodatnim problemom: nedostatak kvalifikovanih zaposlenih, naročito u tehničkom sektoru, pa je sposobnost ViK-a da monitoriše i implementira buduće investicije na visoko kvalitetan način, u opasnosti.

Procjena nepokretnosti, za potrebe obezbjeđivanja sredstava kojima bi se izvršila potrebna Eksproprijacija, nije završena. Nezvanična - gruba procjena je, da će za postupak eksproprijacije nepokretnosti u vlasništvu fizičkih lica biti potrebno cca 700.000,00 eura. U slučaju da se navedena sredstva ne obezbijede blagovremeno, izvjesno je da će se izbor Izvođača dodatno prolongirati.

PLANIRANO ZA SLJEDEĆI PERIOD

Konsultant i Revident bi u avgustu 2019. trebalo da dostave Opštini ovjerene, prepakovane i korigovane elektronske i štampane verzije projektnih mjera, koje su urađene u skladu sa Odlukama o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa, sve sa pratećim Izvještajima.

Vodacom i Konsultant bi trebalo da raspišu tender u prvoj polovini avgusta 2019. godine.

Tokom avgusta, Uprava za nekretnine bi trebalo da dostavi procjenu neokretnosti.

Opština i ViK bi trebalo da dostave Vodacomu nacrt strategije za umanjenje broja zaposlenih u cilju ispunjenja projektnih odrednica.

Kotor, Tivat, Herceg Novi

Opis projekta	Implementacija hitnih investicionih mjera za Tivat, Kotor i Herceg Novi
Očekivani rezultat radova	Rješavanje hitnih investicionih mjera u sistemu za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine
Vrijednost ugovora	Tivat - Ugovor sa Jedinством za obavezne radove iznosi 1.912.970,21 eura; Opcioni radovi 845.079,36 eura Kotor - Ugovor sa Jedinством za obavezne radove iznosi 734.704,07 eura; Opcioni radovi 152.817,43 eura
Datum početka i datum završetka realizacije ugovora	Tivat početak radova 15.01.2018, 456 kalendarskih dana, uključujući prekid u toku ljetnje turističke sezone 01.06. do 01.09. Kotor početak radova 05.02.2018, 243 kalendarska dana, uključujući prekid u toku ljetnje turističke sezone 15.06. do 01.09.
Investitor	Vodovod i kanalizacija Tivat i Kotor
Izvori finansiranja	Tivat - kredit KfW banke Faze IV u iznosu od 174,171 i faze V2 u iznosu od 2.583.879,00 eura Kotor - kredit KfW banke Faze IV u iznosu od 615,900 i sopstvenog učešća Opštine Kotor u iznosu od 271.621,43 eura
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta (upravljanje projektom)
Konsultant	Fichtner (Njemačka)
Izvođač	MPP Jedinство (Srbija)

Tokom mjeseca jula je nastavljeno sa praksom održavanja redovnih progres sastanaka na kojima se prati napredak radova u Opštinama Kotor i Tivat.

GARANCIJE LOT 2-Kotor:

- Osiguranje radova – ističe 28.07.2018. godine, produžena do 31.03.2019. godine
- Avansna garancija – Avans otplacen.
- Činidbena garancija – ističe 31.10.2019. godine

PLAĆANJA LOT 2-Kotor:

Dosadašnja izvršena plaćanja:

Ukupna plaćena suma sa PDV-om (uključujući avans): 657,207.42€

KfW kredit (Faza IV) 589,021.62€

Opštinsko učešće (bez PDV-a) 55,543.12€

Opštinsko učešće (PDV) 12,642.67€

Radovi u Opštini Kotor su privedeni kraju i izdat je sertifikat o preuzimanju radova. Nakon otklanjanja određenog broja nedostataka i ispostavljanja okončane situacije očekuje se završetak ugovora.

GARANCIJE LOT 1-Tivat:

- Osiguranje radova – ističe 26.02.2019. godine, Aneksom 1 proizveden rok do 02.04.2019.
- Avansna garancija – ističe 27.06.2019. godine
- Činidbena garancija – ističe 27.06.2020. godine

PLAĆANJA LOT 1-Tivat:

Dosadašnja izvršena plaćanja:

Ukupna plaćena suma (uključujući avans): 1,251,504.36€

KfW kredit (Faza IV): 174.171.33 €

KfW kredit (Faza V2): 1,077,333.03€

Opštinsko učešće (PDV) 0

Tokom juna i jula je završen veći dio testiranja novoizgrađene mreže, uz mali dio mreže koji neće moći da se testira zbog već izvršenih priključenja, dok će se za preostali dio izvršiti testiranje nakon završetka turističke sezone 15.09.2019. godine. U julu je potpisan Aneks 7 sa Konsultantom Fichtnerom za pružanje njihovih usluga do 30.09.2019. godine. Vodacom je otpočeo pregovore sa Konsultantom Fichtnerom za njihove usluge izrade kompletne projektne dokumentacije za projektnu mjeru Gornje Seljanovo. Dostavljen je prijedlog Aneksa 8 koji obuhvata ove usluge, koji će nakon usaglašavanja sa Konsultantom biti prosljeđen KfW banci na dobijanje saglasnosti. Rok za izradu projektne dokumentacije je 01.09.2019. godine, kako bi bili u mogućnosti da produžimo postojeći ugovor sa Izvođačem (Jedinstvo) i započeli radove u dvije nove projektne mjere do 30.09.2019. godine.

Kotor, Tivat, Herceg Novi

Opis projekta	Izgradnja postrojenja za solarno isušivanje kanalizacionog mulja za opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi
Izvori finansiranja	KfW donacija za pripremu projekta Kredit KfW za implementaciju investicije
Konsultant	Konsultant za pripremu projekta, kompanija Dahlem (Njemačka)

PROGRES

Implementacija projekta postrojenja za solarno isušivanje mulja za sada je odložena, zbog finansijske neisplativosti investicije, usljed manjih količina proizvedenog mulja na PPOV-u od predviđenih.

Opštine Tivat i Kotor treba u narednom periodu da usaglase i donesu zajednički stav po pitanju

rješavanja problema odlaganja mulja.

FAZA V (Komponenta 2)

Projekat poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju Faza V (komponenta 2) ima za cilj sistemsko unaprijeđenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine u opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi.

Kotor, Tivat, Herceg Novi	
Opis projekta	Projekat Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda
Očekivani rezultat radova	Sistematsko unapređenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine
Opis Projekta	Implementacija dugoročnih investicionih mjera za TV, KO, HN Izrada studije izvodljivosti
Uloga Vodacom	Agencija za implementaciju projekta- upravljanje projektom
Konsultant	Za pripremu Studije izvodljivosti, kompanija Fichtner (Njemačka)
Datum početka	Jul 2014.

PROGRES

Implementacija dugoročnih investicionih mjera za TV, KO, HN

Sve tri Opštine su donijele skupštinske odluke o zaduženju. Opština Tivat na ukupan iznos od 11 miliona eura, Opština Kotor na 5,8 miliona eura, Opština Herceg Novi na 10 miliona eura, iz kredita Faze V2. Opštine su zaključile Ugovore o prosljeđivanju kredita Faze V2 sa Ministarstvom finansija. Završen je postupak pretkvalifikacije za izbor Konsultanta za implementaciju Projekta Faze V2 – dugoročne mjere Tivat, Kotor i Herceg Novi. Konsultant za implementaciju će biti zadužen za izradu glavnih projekata, tenderskog dokumenta za izbor izvođača radova i sprovođenje međunarodne tenderske procedure (po FIDIC Rozoj knjizi) i stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Opština Kotor je, u saradnji sa Vodacomom, Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Njemačkom razvojnom KfW bankom nominovala mjeru izgradnje kanalizacione mreže za naselja Risan i Perast (uključujući tranzitni kanalizacioni sistem prema naselju Muo) za donatorska sredstva u okviru trećeg poziva za projektne prijave, iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Početkom decembra 2018. godine, održan je sastanak Upravnog odbora Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF), prilikom kojeg je ocijenjeno da će projekat Risan/Perast uticati značajno na kvalitet zaštite životne sredine u Bokokotorskom zalivu i doprinijeti ekonomskom razvoju Istog. Projekat je dobio pozitivno mišljenje u postupku odabira projekata (screening), koji je izvršila Evropska komisija i odlučeno je da će iznosom od 4,5 miliona eura biti finansirana izgradnja kanalizacione mreže u Risnu i Perastu, čime će biti riješeno prioritetno pitanje prikupljanja otpadnih voda u ovim primorskim mjestima.

Potpisan je Aneks br. 4 od strane Vodacom i Konsultanta (Fichtner-a). Sadržaj Aneksa br. 4 se odnosi na pripremu Glavnih projekata za sanaciju, poboljšanje i produžetak vodovodne i kanalizacione mreže u Risnu i Perastu (takođe, kao opciona stavka su uključena i naselja Stoliv, Prčanj i Muo).

Potpisan je Aneks br. 6 od strane Vodacom i Konsultanta. Sadržaj Aneksa br. 6 se odnosi na

pripremu Glavnog projekta za poboljšanje sistema vodosnabdijevanja na dionici Muo-Prčanj-Stoliv, kao i na pripremu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, koji obuhvata odabrane mjere za izradu glavnih projekata u okviru usluga iz Aneksa br. 4 i Aneksa br. 6.

U toku je rješavanje pitanja vršenja revizije Glavnih projekata, koji su predmet Aneksa br. 4 i Aneksa br. 6, u skladu sa novim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nakon završenog evaluacionog postupka, zaključeno je da se usluge revizije predmetne projektne dokumentacije dodijele Konsultantu Sun Invest-u d.o.o. Budva, kao finansijski najpovoljnijoj i tehnički prihvatljivoj ponudi. Potpisivanje konsultantskog Ugovora se očekuje nakon dobijanja saglasnosti na Isti, od strane KfW banke. Konsultantske usluge za vršenje revizije će biti finansirane iz kreditnih sredstava KfW banke, a u okviru Projekta Faze V2.

Tenderska dokumentacija, kao i pozivno pismo za izbor Konsultanta za implementaciju Projekata Faze V2, su dostavljeni kompanijama (pet pretkvalifikovanih Konsultanata) koje su ušle u uži izbor, nakon pretkvalifikacionog postupka. U proteklom mjesecu, određeni pretkvalifikovani Konsultanti su dostavili svoje tehničke i finansijske ponude. U narednom periodu se očekuje formiranje Tenderske komisije, koja će zajedno sa tender agentom KfW banke izvršiti evaluaciju dostavljenih ponuda i nakon toga izabrati Konsultanta za implementaciju Projekata Faze V2.

Kotor, Tivat, Herceg Novi

Opis projekta	Prateće mjere za održivo upravljanje PPOV
Cilj projekta	Adekvatno upravljanje PPOV u dugoročnom periodu
Vrijednost	2 mil. €
Datum početka	Avgust 2015
Izvori finansiranja	Donacija KW banke
Uloga Vodacoma	Agencija za implementaciju projekta

Na inicijativu Vodacoma, KfW banka je angažovala stručnjaka sa ciljem procjene konkretnih potreba i osnovnih informacija za program Pratećih mjera za održivo upravljanje postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda duž Crnogorske obale, a čija je izgradnja finansirana iz sredstava programa finansijske saradnje sa Saveznom Republikom Njemačkom, preko KfW banke.

Program Pratećih mjera koje se finansiraju iz donacije KfW banke obuhvata tri komponente:

1. Implementaciju programa obuke osoblja koje će upravljati i održavati postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione sisteme.
2. Pružanje podrške internacionalnih stručnjaka Opštinama, ViK-ovima, Ministarstvu i Vodacomu u vezi urgentnih aspekata koji se odnose na održivo upravljanje PPOV-ima, a od kojih je trenutno najprepoznatljiviji problem odlaganja kanalizacionog mulja kao i definisanja upravljačkog modela za PPOV Tivat/Kotor.
3. Pružanje podrške za uspostavljanje Regulatorne agencije za komunalne djelatnosti, odnosno novog sektora u okviru Regulatorne agencije za energetiku, i uspostavljanje odgovarajuće tarifne metodologije.

U pogledu rješavanja pitanja odlaganja kanalizacionog mulja PPOV Tivat/Kotor, Konsultant je kao

najbolje i ekonomski najisplativije rješenje predložio sanaciju/rekultivaciju starih odlagališta otpada, i to: neuređenog odlagališta Sinjarevo (na teritoriji opština Kotor i Tivat) i zatvorene sanitarne deponije Lovanja (teritorija Kotora) upotrebom kanizacionog mulja i zemlje.

Kao mogući način implementacije Projekta rekultivacije/sanacije odlagališta otpada ustanovljeno je da Lokalni plan upravljanja otpadom treba da predstavlja osnov za implementaciju datog projekta i potrebno je da predvidi upotrebu obrađenog mulja za sanaciju deponije i neuređenog odlagališta nakon čega bi Konsultant za implementaciju Faze V2 izradio Projekat rekultivacije/sanacije za obje lokacije i odgovarajući Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu.

Prema informacijama dobijenim od Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor, usvajanje Lokalnog Plana upravljanja otpadom se očekuje nakon rješenja spornog pitanja određivanja lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada. Odnosno, Plan se ne može usvojiti dok Skupština ne usvoji Odluku o određivanju lokacije za privremeno skladištenje građevinskog otpada.

Izvršetak o ispitivanju uzoraka zemljišta sa deponija Lovanja-Sinjarevo je završen.

Nakon niza prethodno održanih sastanaka između predstavnika KfW banke, Vodacoma i Investitora (Opštine Kotor i Tivat), u cilju definisanja narednih aktivnosti po pitanju strategije za odlaganje kanizacionog mulja, projektna mjera Rekultivacija/sanacija odlagališta otpada upotrebom mulja sa PPOV-a Tivat/Kotor je uključena kao Opciona stavka u okviru Projektnog zadatka za Konsultanta za implementaciju Faze V2 - Dugoročne mjere.

Predstavnici Vodacoma su održali zajednički sastanak sa predstavnicima Opština Kotor i Tivat, kako bi definisali naredne aktivnosti po pitanju strategije za zbrinjavanje mulja i u vezi sa zauzimanjem konačnog stava Opština, u cilju upućivanja zajedničkog dopisa prema MORiT-u i organizovanja sastanka na kojem bi se razgovaralo o navedenom problemu.

Konsultant pruža podršku pri uspostavljanju Službe za regulisane komunalne djelatnosti, kao nove službe u okviru Regulatorne agencije za energetiku.

Aktivnosti Vodacoma na razvoju kapaciteta vodovodnih preduzeća

Bar, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Ulcinj	
Opis projekta	Razvoj kapaciteta javnih vodovodnih i kanizacionih preduzeća
Benčmarking Tokom mjeseca jula, Vodacom je vršio prikupljanje finansijskih izvještaja i bruto bilansa ViK-ova za 2018. godinu, kako bi pristupio reviziji podataka koji se koriste za izračunavanje ključnih indikatora poslovanja ViK-ova u cilju izrade Godišnjeg benčmarking izvještaja za 2018. godinu. Mjesečni izvještaj za jun 2019. je izrađen i dostavljen Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Opštinama, ViK-ovima i benčmarking koordinatorima na dalje korišćenje.	
